

前言：

設計處各專案送審圖遵照船東習慣及規範要求，分紙本送審或電子送審。紙本送審，船東將以紙本退審，紙本退審圖容易汙損或遺失，保存不易，且有無法多人同時閱讀的缺點。若如為電子退審，就採以 E-MAIL 方式進行作業，近日常有檔案過大無法傳送，造成資訊漏失，以及退審信各船級及船東格式不同，以致於 outlook 搜尋不易。為了適應各專案的需求及並統一格式，將所有的送退審資訊轉化為電子檔的形式保存，將船東或船級的退審資訊(圖、信函等)，建置資料於專案管理_退審作業系統中，專案管理_電子化退審圖作業程式以此構想開發。

電子化退審圖作業- 功能展示(以陽明 2800TEU 貨櫃船(H1113 十艘)舉例)

1. 陽明 2800TEU：送審單位 (Owner)



藍圖管理

專案管理

圖檔管理

材料系統

工令: N6113

單位:

ABT

圖號: 所有圖號

關鍵字:

☒ 全部

☐ 未退審

☐ 未結案

☐ 已結案

MIDSHIP SECTION AND TYPICAL TRANS. BHD

	送審信圖編號	ABT 圖號	版次	冊	目的	送審日期	要求退審	退審份數	單位	適用船	退審信圖編號	退審日期	退審份數	意見	退審圖檔
001	H1113-ABS-DD-0004	BVT	320001		A	20190214	20190307	0	ABT	II---II--I	T1834365	20190314	0	Y	Y
002	H1113-ABS-DD-0006	CR	320001	A	A	20190620	20190711	0	ABT	II---II--I	T1879587	20190709	0	Y	Y
003	H1113-ABS-DD-0005	DNV	542 01		A	20190223	20190316	0	ABT	II---II--I	T1837158	20190320	0	Y	Y
004	H1113-ABS-DD-0007	D3642 01	A	A	A	20190425	20190516	0	ABT	II---II--I	T1860774	20190523	0	Y	-
005	H1113-ABS-DD-0142	K0000901			A	20200221	20200313	0	ABT	II-----	T1962480	20200319	0	Y	-
006	H1113-ABS-DD-0162	K0000901	R1		A	20200513	20200603	0	ABT	II-----	T1997224	20200522	0	N	Y
007	H1113-ABS-DD-0001	K1102002			A	20180917	20181008	0	ABT	II---II--I	T1790491	20181030	0	N	Y
008	H1113-ABS-DD-0001	K1100000			A	20180917	20181008	0	ABT	II---II--I	T1790843	20181101	0	N	Y
009	H1113-ABS-DD-0018	K1100000	A		A	20181114	20181205	0	ABT	II---II--I	T1806243	20181214	0	N	Y
010	H1113-ABS-DD-0108	K1100000	AR1		A	20190624	20190715	0	ABT	II---II--I	T1879589	20190709	0	N	Y
011	H1113-ABS-DD-0011	K1100041			A	20181016	20181106	0	ABT	II---II--I	T1794246	20181126	0	N	Y
012	H1113-ABS-DD-0046	K1100041	A		A	20190212	20190305	0	ABT	II---II--I	T1833393	20190311	0	Y	Y
013	H1113-ABS-DD-0009	K1100043			R	20181011		0	ABT	II---II--I					-
014	H1113-ABS-DD-0009	K1100044			R	20181011		0	ABT	II---II--I					-
015	H1113-ABS-DD-0011	K1100101			A	20181016	20181106	0	ABT	II---II--I	T1794248	20181116	0	Y	Y
016	H1113-ABS-DD-0047	K1100101	A		A	20190213	20190306	0	ABT	II---II--I	T1834115	20190313	0	N	Y
017	H1113-ABS-DD-0105	K1100101	B		A	20190620	20190711	0	ABT	II---II--I	T1879586	20190709	0	N	Y
018	H1113-ABS-DD-0011	K1100102			A	20181016	20181106	0	ABT	II---II--I	T1794248	20181116	0	Y	Y
019	H1113-ABS-DD-0047	K1100102	A		A	20190213	20190306	0	ABT	II---II--I	T1834115	20190313	0	N	Y

2. 選取退審作業的單位及圖號，進入次頁後，依欄位鍵入所需資訊



006	H1113-YML-DD-0082	D2083011		A	20190227	20190320	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-051	20190313	1	Y	-	Y
007	H1113-YML-DD-0101	D2083011	A	A	20190329	20190419	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-064	20190419	1	N	-	Y
008	H1113-YML-DD-0075	D2321001		A	20190220	20190313	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-049	20190308	1	Y	-	Y
009	H1113-YML-DD-0118	D2321001	R1	A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
010	H1113-YML-DD-0141	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
011	H1113-YML-DD-0103	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
012	H1113-YML-DD-0155	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
013	H1113-YML-DD-0051	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
014	H1113-YML-DD-0137	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
015	H1113-YML-DD-0143	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
016	H1113-YML-DD-0012	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
017	H1113-YML-DD-0020	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
018	H1113-YML-DD-0059	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
019	H1113-YML-DD-0027	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
020	H1113-YML-DD-0138	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
021	H1113-YML-DD-0151	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
022	H1113-YML-DD-0023	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
023	H1113-YML-DD-0052	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
024	H1113-YML-DD-0096	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
025	H1113-YML-DD-0125	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
026	H1113-YML-DD-0029	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
027	H1113-YML-DD-0143	D2321001		A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
028	H1113-YML-DD-0027	D2724001		A	20181129	20181220	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-024	20181221	1	Y	-	Y
029	H1113-YML-DD-0091	D2724001	A	A	20190312	20190402	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-062	20190412	1	Y	-	Y
030	H1113-YML-DD-0146	D2724001	AR1	A	20190807	20190828	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-089	20191101	1	N	-	Y
031	H1113-YML-DD-0164	D2724001	AR2	A	20191121	20191212	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-097	20200218	1	N	-	Y
032	H1113-YML-DD-0231	D2724001	AR3	A	20200902	20200923	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-113	20200917	1	N	-	Y
033	H1113-YML-DD-0038	D2734001		A	20181222	20190112	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-041	20190201	1	Y	-	Y

PP01.11.0.0[192168.62.40].N6175-->退審圖作業--退審資訊

CATHODIC PROTECTION ANODE (BALLAST TANK)

工令: N6113 審圖單位: OWN 圖號: D2322001 冊別: - 版次: R0 系列船: IIIIIIIIII 超始頁數 結束頁數

退審信函編號: EESBWG-CSBC1113-068 退審信函檔案: N6113DVAAPPROVED_OWN_INVEESBWG-CSBC1113-068.pdf 轉入 顯示

退審日期: 20190507 退審圖檔案: 轉入 顯示

退審份數: 1 退審意見檔案: N6113DVAAPPROVED_OWN/D2322001/CO_D2322001.pdf 檔案轉入前, 先輸入超始頁數與結束頁數

退審意見: Y 結案日期: 20190816 結案檔案: N6113DVAAPPROVED_OWN/D2322001/VCL_D2322001.xls 轉入 顯示

文管編號: 19F0570 儲存 取消 建立退審意見


Outlook 檔案

3. 文管編號說明一：如船東船級有意見退審，退審意見：Y，系統自動建立一筆文管資料。

給予文管編號並於設計管理系統-行政管理-文管中心中查詢辦況。

編號	建立日期	單位/主目	簽辦單	物C字393號 HULL INVENTOR...	性質	類別	股別	承辦人	姓名	審判	應完成日期	完成日期	處理結果	延誤原因	展延日期
218419F0589	2019/05/14	物料綜合	簽辦單	物C字394號 VENT. DUCT 兩...	Y:簽辦	F	Z	094122	李國太	D	20190521	20190531	done		
218519F0588	2019/05/14	物料綜合	簽辦單	物C字394號 VENT. DUCT 兩...	Y:簽辦	F	Z	094122	李國太	D	20190521	20190517	DONE		
218619F0587	2019/05/14	物料綜合	簽辦單	物C字394號 CANVAS COVER...	Y:簽辦	F	A	092035	潘善騰	D	20190521	20190517	DONE		
218719F0586	2019/05/14	品保品質	巡迴抽查報告表	QC-1099-099 Hno...	Q:QSE	F	Q	104881	楊榮鏗	D	20190521			5/17...	
218819F0585	2019/05/14	N6154P021A-AS	廠家圖(計畫收送審用圖)	N61...	R:收圖	F	K	092319	曾明殿	C	20190527	20191226	完成收圖	廠家...	20190930
218919F0584	2019/05/13	N2139 船東	退審圖	圖號: D3540001【真空馬...	P:退審	F	Q	100345	張俊敏	C	20190520	20190702	完成意見處理		
219019F0583	2019/05/10	N6113C156A-AF	廠家圖(計畫收送審用圖)	N61...	R:收圖	F	K	108214	林楷霖	C	20190524	20190415	完成		
219119F0582	2019/05/10	N6154C281A-AS	廠家圖(計畫收送審用圖)	N6154N...	R:審圖	F	M	112425	黃春輝	C	20190524	20190723	done	規格...	
219219F0581	2019/05/10	N6154G119A-AF	廠家圖(計畫收送審用圖)	N61...	R:收圖	F	K	110850	施家豪	C	20190524	20190523	完成收圖		
219319F0580	2019/05/10	N6154C295A-AH	廠家圖(計畫收送審用圖)	N61...	R:收圖	F	K	111488	許凱庭	C	20190523	20190510	完成	非我權責	
219419F0579	2019/05/10	物料採購	簽辦單	螺絲螺母等二年期合約...	Y:簽辦	F	A	092035	潘善騰	C	20190517	20190517	DONE		
219519F0578	2019/05/10	N6154 船東	退審圖	圖號: D3553031【辦公室...	P:退審	F	Q	X00269	廖雄...	C	20190517	20190614	完成意見處理		
219619F0577	2019/05/10	N6154 船東	退審圖	圖號: D3553021【健身艇...	P:退審	F	Q	X00269	廖雄...	C	20190517	20190524	完成意見處理		20190520
219719F0576	2019/05/10	N6154 船東	退審圖	圖號: D2721001【救生艇...	P:退審	F	Q	112527	葉智豪	C	20190517	20190708	完成意見處理		
219819F0575	2019/05/10	N6154 船東	退審圖	圖號: K3554401【鑄匙牌...	P:退審	F	Q	X00255	鄧曉...	C	20190517	20190521	完成意見處理		
219919F0574	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: D3554004【HARDNA...	P:退審	F	Q	X00269	廖雄...	C	20190517	20190816	完成意見處理		20190524
220019F0573	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: D2985011A【CO2 F...	P:退審	F	K	111411	邱逸晨	C	20190517	20200603	完成意見處理		
220119F0572	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: D3551201【UPHOLS...	P:退審	F	Q	X00269	廖雄...	C	20190517	20200117	完成意見處理		20191115
220219F0571	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: K3400411【MATERI...	P:退審	F	Q	X00269	廖雄...	C	20190517	20191005	完成意見處理		
220319F0570	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: D2322001【CATHOD...	P:退審	F	T	112550	王柏揚	C	20190517	20190816	完成意見處理	7/25...	20190830
220419F0569	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: K3000604【TEST G...	P:退審	F	Q	112527	葉智豪	C	20190517	20190816	完成意見處理		
220519F0568	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: K2000502【HULL I...	P:退審	F	M	111206	陳晨華	C	20190517	20191005	完成意見處理		
220619F0567	2019/05/10	N6113 船東	退審圖	圖號: D2948021A【BILGE...	P:退審	F	M	112425	黃春輝	C	20190517	20190507	完成意見處理		
220719F0566	2019/05/10	N2088 CR	退審圖	圖號: K2000450【BALLAST...	P:退審	F	M	095330	方偉年	C	20190517	20190522	完成意見處理		
220819F0565	2019/05/09	N6113 船東	退審圖	圖號: D3642001A【AIR C...	P:退審	F	Q	110689	柳嘉承	C	20190516	20190816	完成意見處理	意見...	

4. 文管編號說明二：同時於承辦人的報工系統中，也會顯示有文件作業中需經意見澄清處理完畢獲得船東或船級審核結案後，提示才會消除。

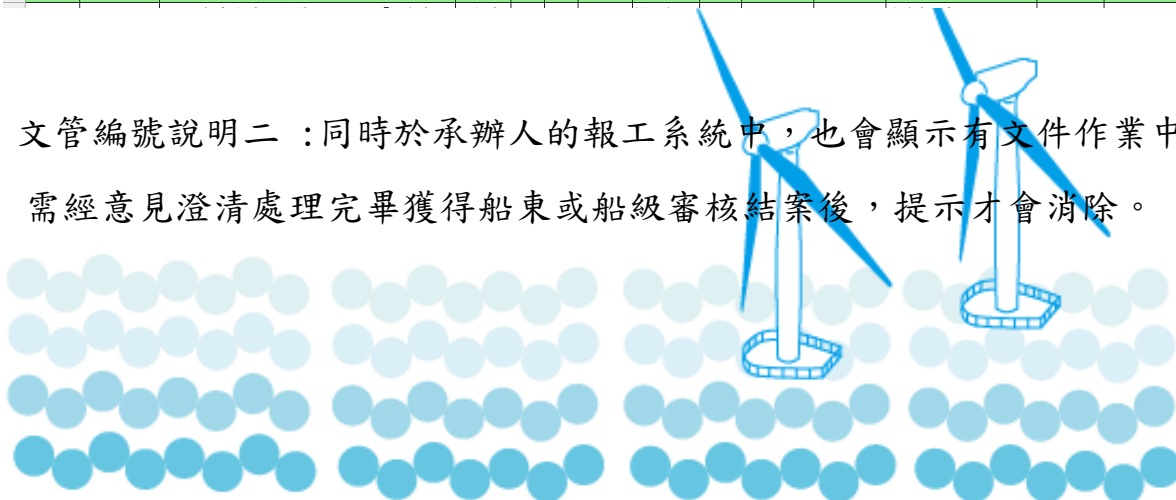

WinMh2020[1.0.2.2]

年度與月份：202105 110年5月 版本與說明 09:57:30

劉幸芳工時月報表 請假作業

加班單紀錄 請假單紀錄

您有1份文件作業中。

就緒 今天刷卡：0726

5. 結案檔案：

OWNER'S APPROVAL SHEET							
INO. 1113-1122				DWG.NO. : D2322001	HNO. 1113-1122		
				DWG. TITLE : CATHODIC PROTECTION ANODE (BALLAST TANK)			
Item	Sub-Ver.	Page	OWNER'S COMMENT		BUILDER'S REPLY		Owner Reply
No.	No.	No.	Last Comment Date	In charge : (By Owner) 02-2422-8881-ext-215陳冠宇工程師	In charge : 07-8059888-ext-2597王柏揚	Last Reply Date	
3		3		Sea water will be stored WBT after launch. The interval between launch and delivery is about 0.5 years, so the total life time shall be about 5.5 years. Please re-check the quantity of Alum anode.	The WBT is usually unfinished at launch, we will use fresh water to store in WBT. So we were not add 0.5 years to calculate the life time.		Noted and fresh water shall be used in WBT before delivery.
				Noted and fresh water shall be used in WBT before delivery.	Actually, CSBC is use fresh water in unfinished WBT between launch and sea trial, and between sea trial and delivery is about 0.1~0.2 years will used sea water to test. According CSBC experience, it's not affect the life time of protection anode.		Noted.
6		G		The material sheet including analysis report and classed certificates shall be provided for approval.	Material sheet including analysis report refer to the attachment 5. If owner need classed certificates, shall be pay extra cost.		Noted.

6. 設計處管理課，將船東或船級的退審資訊(圖、信函等)，建置資料於專案管理_退審作業系統中後，設計同仁個人皆可於藍圖管理系統中查詢到所需退審資訊。

船計管理系統2010藍圖管理 2010/02/19

工令: N6113 類別: 1 組別: 圖號: K1100 查詢: 所有船號 輸出Excel 分組送審

工令	圖號	冊	版次	說明	計畫出圖	計畫送審	優先	重要	ABT	--	船東	政府	壳歌蘭	工作計畫	檢核表
0001	N6113	K1100000	1	K MIDSHIP SECTION AND TYPICAL TRANS. BRD	20180914	20180914	A	5	A	A	F			K1100000	
0002	N6113	K1100041	1	K SHELL EXPANSION	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100041	
0003	N6113	K1100043	1	K STRUCTURE LINES (FORE)	20181015	20181015	B	S	R					K1100043	
0004	N6113	K1100044	1	K STRUCTURE LINES (AFT)	20181015	20181015	B	S	R					K1100044	
0005	N6113	K1100101	1	K CARGO HOLD CONST. (PLAN 1/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100101	
0006	N6113	K1100102	1	K CARGO HOLD CONST. (PLAN 2/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100102	
0007	N6113	K1100103	1	K CARGO HOLD CONST. (PLAN 3/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100103	
0008	N6113	K1100104	1	K CARGO HOLD CONST. (PLAN 4/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100104	
0009	N6113	K1100105	1	K CARGO HOLD CONST. (PROFILE 1/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100105	
0010	N6113	K1100106	1	K CARGO HOLD CONST. (PROFILE 2/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100106	
0011	N6113	K1100107	1	K CARGO HOLD CONST. (PROFILE 3/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100107	
0012	N6113	K1100108	1	K CARGO HOLD CONST. (PROFILE 4/4)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100108	
0013	N6113	K1100109	1	K CARGO HOLD CONST. (TRANSVERSE SECT.)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100109	
0014	N6113	K1100201	1	K ENGINE ROOM CONST. (UPP. PART)	20181115	20181115	A	S	A	A	F			K1100201	
0015	N6113	K1100203	1	K ENGINE ROOM CONST. (DOUBLE BOTTOM)	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100203	
0016	N6113	K1100292	1	K DIESEL GENERATOR SET	20190102	20190102	A	S	A	A	F			K1100292	
0017	N6113	K1100295	1	K PLUMBER BLOCK SEAT	20190102	20190102	A	S	A	A	F			K1100295	
0018	N6113	K1100301	1	K STERN CONSTRUCTION	20181115	20181115	A	S	A	A	F			K1100301	
0019	N6113	K1100401	1	K BOW CONSTRUCTION	20181015	20181015	A	S	A	A	F			K1100401	
0020	N6113	K1100691	1	K HATCH COAMING CONSTRUCTION	20190227	20190227	A	S	A	A	F			K1100691	
0021	N6113	K1100809	1	K SCHEM OF HOLD LINE	20181015	20181015	B	S						K1100809	
0022	N6113	K1100831	1	K HULL CONSTRUCTION STANDARD	20180914	20180914	B	S	A	A	F			K1100831	
0023	N6113	K1100851	1	K BLOCK ARRANGEMENT	20181015	20181015	B	S	R					K1100851	
0024	N6113	K1100871	1	Q TANK TEST PLAN	20180502	20180502	C	0	A					K1100901	
0025	N6113	K1100901	1	K CAL. OF MIDSHIP SECTION MODULUS (INCL. CLASS REQ.)			B	S						K1100901	
0026	N6113	K1100902	1	K CARGO HOLD ANALYSIS			B	S						K1100902	

工令 圖號 冊 版次 出圖日期 單位 目的 信函編號/申請單編號 退審信函編號 船號 工作計畫 姓名 計畫開始 計畫結束 實際開始 實際結束 計畫工時 實際工時

N6113	K1100000			2018/09/17	AST	A	H1113-ABS-DD-0001	T1790843	2	N6113	K1100000	陳昌助	2018/08/20	2018/09/14	2018/09/04	2018/09/13	1	
N6113	K1100000		A1	2019/06/24	AST	A	H1113-ABS-DD-0108	T1879589	2	N6113	K1100000R	陳昌助	2018/10/15	2019/06/30	2018/11/01	2019/03/04	1	
N6113	K1100000			2018/11/29	BVT	A	H1113-BV-DD-0004	JPO-19-00326	2									
N6113	K1100000		A	2018/12/20	BVT	A	H1113-BV-DD-0005	JPO-19-00326	2									
N6113	K1100000			2018/11/29	CR	A	H1113-CR-DD-0004	2019-0029...	2									
N6113	K1100000		A	2018/12/20	CR	A	H1113-CR-DD-0005	2019-0029...	2									
N6113	K1100000			2018/11/29	DMV	A	H1113-DMV-DD-0004	D40171-J-137	2									

7. 管理數據統計、分析報表作業 也都可於送審圖狀況中快速查詢：

藍圖系統 工作計劃 材料系統 行政管理 船體設計 電機設計 基本設計 回顧單 PDMS VALVE 操作說明書 機蓋(W)									
工令:	N6113	OWNER	全部 尚未送審 延遲送審 送審未退 退審延遲						
類別	原稿	修改	78	374	373				
圖號	D1671010	D2321001	55	455	454				
圖號	目的	計畫送審	實際送審	冊	版次	要求退審日期			
D1671010	TWISTED TYPE FULL SPADE RUDDER WITH ASSOCIATED PA...	A	20190131	20190116		20190206			
D1671010	TWISTED TYPE FULL SPADE RUDDER WITH ASSOCIATED PA...	A	20190131	20190307	A	20190328			
D1671010	TWISTED TYPE FULL SPADE RUDDER WITH ASSOCIATED PA...	A	20190131	20190605	B	20190626			
D1671010	TWISTED TYPE FULL SPADE RUDDER WITH ASSOCIATED PA...	A	20190131	20191219	BR1	20200109			
D1671010	TWISTED TYPE FULL SPADE RUDDER WITH ASSOCIATED PA...	A	20190131	20200219	BR2	20200311			
D2083011	AIR ESCAPE PIPE HEAD (FLOAT TYPE)	A	20190211	20190227		20190320			
D2083011	AIR ESCAPE PIPE HEAD (FLOAT TYPE)	A	20190211	20190329	A	20190419			
D2321001	CATHODIC PROTECTION ANODE (SEA CHESTS & B/T TUNN...	A	20190131	20190220		20190313			
D2321001	CATHODIC PROTECTION ANODE (SEA CHESTS & B/T TUNN...	A	20190131	20190426	R1	20190517			
D2321001	CATHODIC PROTECTION ANODE (SEA CHESTS & B/T TUNN...	A	20190131	20190704	R2	20190725			
D2322001	CATHODIC PROTECTION ANODE (BALLAST TANK)	A	20190131	20190402		20190423			
D2322001	CATHODIC PROTECTION ANODE (BALLAST TANK)	A	20190131	20190919	R1	20191010			
D2331001	IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION SYSTEM	A	20190118	20190118		20190208			

8. 選取退審作業的單位及圖號，進入次頁後，依欄位鍵入所需資訊，存檔後系統會產生一封電郵，即可寄發退審通知給承辦人、及其課長跟 Leader。

006 H1113-YHL-DU-0082	D2083011	A	A	20190227	20190520	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-051	20190313	1	Y	-	Y
007 H1113-YHL-DD-0101	D2083011	A	A	20190329	20190419	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-064	20190419	1	N	-	Y
008 H1113-YHL-DD-0075	D2321001		A	20190220	20190313	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-049	20190308	1	Y	-	Y
009 H1113-YHL-DD-0118	D2321001	R1	A	20190426	20190517	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-071	20190521	1	Y	-	Y
010 H1113-YHL-DD-0141	D2321001		A											
011 H1113-YHL-DD-0103	D2321001		A											
012 H1113-YHL-DD-0155	D2321001		A											
013 H1113-YHL-DD-0051	D2321001		A											
014 H1113-YHL-DD-0137	D2321001		A											
015 H1113-YHL-DD-0143	D2321001		A											
016 H1113-YHL-DD-0012	D2321001		A											
017 H1113-YHL-DD-0020	D2321001		A											
018 H1113-YHL-DD-0059	D2321001		A											
019 H1113-YHL-DD-0027	D2321001		A											
020 H1113-YHL-DD-0138	D2321001		A											
021 H1113-YHL-DD-0151	D2321001		A											
022 H1113-YHL-DD-0023	D2321001		A											
023 H1113-YHL-DD-0052	D2321001		A											
024 H1113-YHL-DD-0096	D2321001		A											
025 H1113-YHL-DD-0125	D2321001		A											
026 H1113-YHL-DD-0029	D2321001		A											
027 H1113-YHL-DD-0143	D2321001		A											
028 H1113-YHL-DD-0027	D2724001		A	20181129	20181220	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-024	20181221	1	Y	-	Y
029 H1113-YHL-DD-0091	D2724001		A	20190312	20190402	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-062	20190412	1	Y	-	Y
030 H1113-YHL-DD-0146	D2724001	AR1	A	20190807	20190828	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-089	20191101	1	N	-	Y
031 H1113-YHL-DD-0164	D2724001	AR2	A	20191121	20191212	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-097	20200218	1	N	-	Y
032 H1113-YHL-DD-0231	D2724001	AR3	A	20200902	20200923	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-113	20200917	1	N	-	Y
033 H1113-YHL-DD-0038	D2724001		A	20181222	20190112	1	OWN	IIIIIIIIII	EESBWG-CSBC1113-041	20190201	1	Y	-	Y

PP01.1.1.0(192.168.62.40):N6175-->退審作業--退審資訊

CATHODIC PROTECTION ANODE (BALLAST TANK)

工令: N6113 審圖單位: OWN 圖號: D2322001 冊別: - 版次: R0 系列船: IIIIIIIIII

退審信函編號: EESBWG-CSBC1113-068 退審信函檔案: N6113\DA\APPROVED_OWN_INV\EESBWG-CSBC1113-068.pdf


退審日期: 20190507 退審圖檔: 退審意見: Y 退審意見檔案: N6113\DA\APPROVED_OWN\CO_D2322001.pdf


承辦人: 112550 王柏鴻 結束日期: 20190816 結束檔案: N6113\DA\APPROVED_OWN\CO_D2322001\CO_D2322001.xls

文管編號: 19F0570

Outlook 檔案

9. 電郵主旨明確顯示船號、退審單位、圖號，如有意見內文也會說明有文管編號必須進行意見處理。

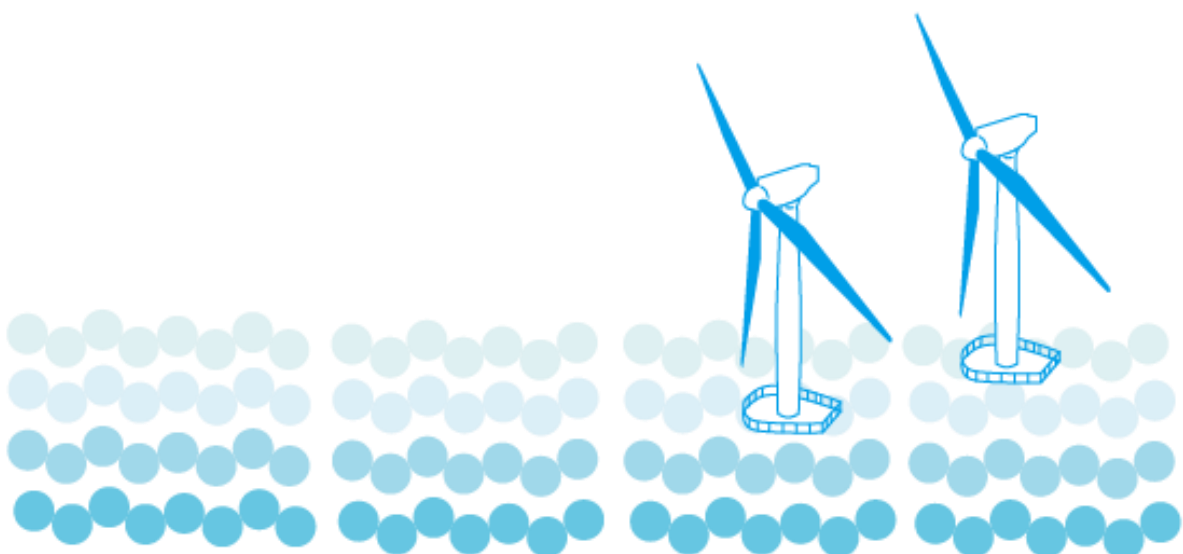

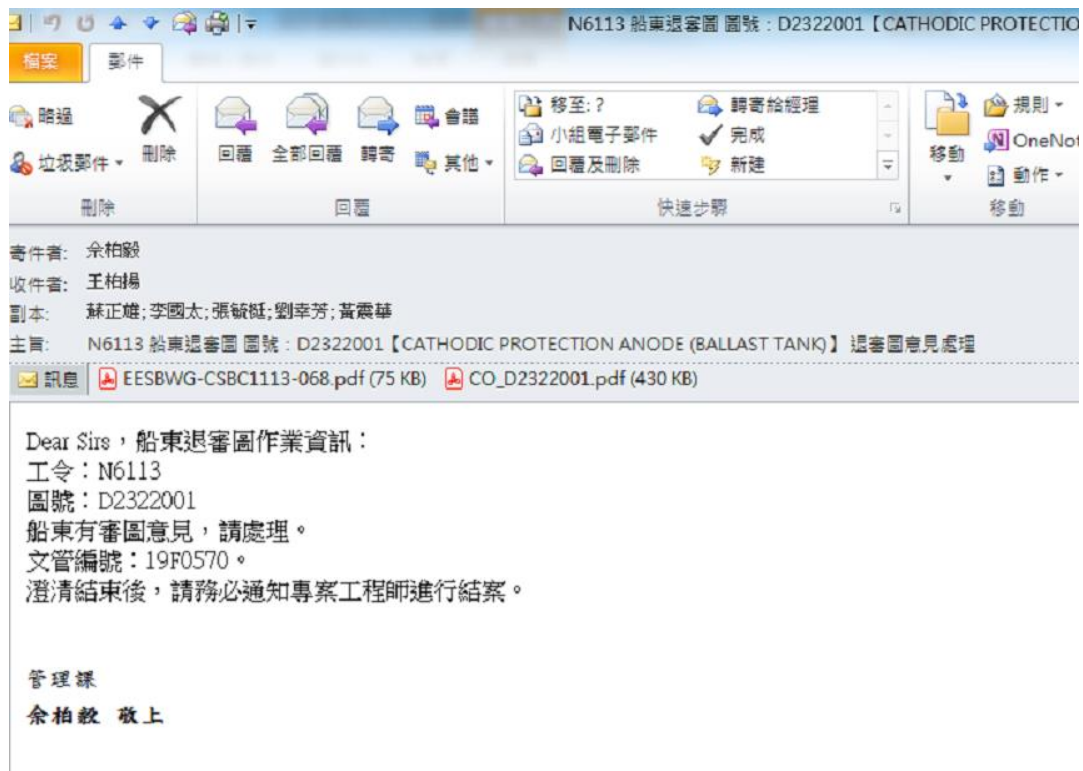

電子化退審圖作業執行成效：

1. 無論是以紙本或電子檔形式退審，一律將船東或船級的退審資訊(圖、信函等)，建置資料於專案管理_退審作業系統中，設計同仁皆可於設計藍圖管理系統中查詢到所需退審資訊。
2. 每一份送審圖都有文件管理編號，並結合承辦人的報工系統，做意見需處理提醒，讓各承辦人、課長等能夠進行意見回覆管理。
3. 各案有專案信箱接收退審意見，避免檔案太大有同仁無法收信，造成資訊漏失。
4. 資料庫建立後，各項管理數據皆可於系統中快速查詢。
5. 由系統發出的退審通知，各專案皆以相同格式，以船號、退審單位、是否有意見須處理為信件主旨，便於歸檔及搜尋。
6. 唯一缺點是需有專人分類並於系統中建立資料及後續歸檔，相對花時間。

